


SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO: LISTA DI CONTROLLO PER PICCOLI CANTIERI


Nome del cantiere:


In questo documento sono riportate alcune misure di sicurezza di base, resta a voi la definizione e la messa in atto di tutte le altre misure necessarie, a dipendenza delle circostanze.

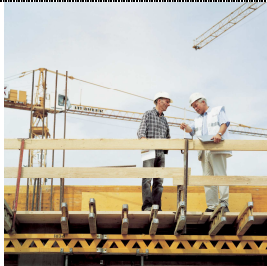
NB: nel caso in cui rispondiate «No» a determinate domande troverete una nota a fine testo (pagina 4) con riferimenti alle documentazioni in grado di aiutarvi a migliorare la situazione.


Pianificazione / Organizzazione

<p>1. Le misure di sicurezza così come la loro remunerazione sono previste nel contratto d'appalto? (OLCostr art. 3 cpv. 2)</p>	No <input type="checkbox"/> Vedi nota 1	In parte <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	Se non sono previste esse vanno esplicitate! 
---	---	--------------------------------------	--------------------------------	---

	No <input type="checkbox"/> Vedi nota 1	In parte <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	<p>2. Vi siete assicurati del fatto che il committente sia cosciente del sostegno che egli deve assicurare all'impresa nell'ambito della pianificazione delle misure di sicurezza (art. 104 SIA 118)?</p>
--	---	--------------------------------------	--------------------------------	--


<p>3. Avete designato per il cantiere una persona competente incaricata della sicurezza sul lavoro (di solito l'assistente o il capocantiere). Questa persona è cosciente del ruolo che deve assumere? (OLCostr art. 4)</p>	No <input type="checkbox"/> Vedi nota 1	In parte <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	
--	---	--------------------------------------	--------------------------------	---

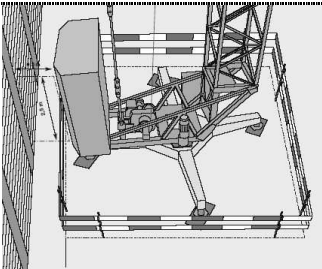
	No <input type="checkbox"/> Vedi nota 2	In parte <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	<p>4. Gli assistenti e i capi cantieri conoscono le regole tecniche relative alla sicurezza sul lavoro per tutto quanto sono chiamati ad eseguire?</p>
---	---	--------------------------------------	--------------------------------	---


<p>5. Nelle riunioni di cantiere vengono trattate le questioni riferite alla sicurezza?</p>	No <input type="checkbox"/> Vedi nota 1	In parte <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	
--	---	--------------------------------------	--------------------------------	---


Preparazione / Esecuzione / Comprensione


	No <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/>	6. Il consumo di alcol sul cantiere è stato regolamentato?
7. Il personale è equipaggiato e porta ogni volta che ciò è necessario:	No <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/>	
- le scarpe di sicurezza?	No <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/>	
- il casco?	No <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/>	
- gli occhiali, le protezioni respiratorie e uditive, il necessario in funzione del tipo di lavoro da eseguire?	No <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/>	
	No <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/>	8. Tutti coloro che usano gru sono in possesso del relativo permesso o patente?
9. Il materiale e le attrezzature necessarie per la sicurezza sono integrate nell' inventario di materiale a disposizione in cantiere?	No <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/>	
Il materiale è presente in quantità sufficiente ed è idoneo?	No <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/>	
	No <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/>	10. Avete previsto una lista con i numeri di chiamata urgente e il necessario per i primi soccorsi sul cantiere (farmacia)?
11. Le baracche di cantiere e le installazioni sanitarie offrono il comfort necessario?	No <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/>	
	No <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/>	12. La sicurezza delle persone esterne al cantiere (pubblico, passanti) e dei lavoratori sono assicurate? La recinzione di cantiere è stata eseguita correttamente?


<p>13. Gli scavi vengono eseguiti secondo le regole dell'arte da persone competenti?</p> <p>Al più tardi a partire da 1.50 m si prevedono scarpate sufficienti o la puntellazione dello scavo?</p>	No <input type="checkbox"/>	In parte <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	
	No <input type="checkbox"/>	In parte <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	


	No <input type="checkbox"/>	In parte <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	<p>14. La zona di movimento della gru a montaggio rapido è protetta dal transito di personale e dal deposito di materiale?</p>

<p>15. Gli accessi al cantiere, scale e vie di transito sono libere e sicure?</p>	No <input type="checkbox"/>	In parte <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	

	No <input type="checkbox"/>	In parte <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	<p>16. Il deposito del materiale e dell'equipaggiamento è sicuro e ordinato, permettendo la necessaria libertà di passaggio?</p>

<p>17. Le protezioni laterali sono posate (parapetti in tutti i luoghi con pericolo di caduta nel vuoto), le scale sono sicure, i ponteggi sono disponibili e rispettosi delle norme vigenti, ecc.)?</p>	No <input type="checkbox"/>	In parte <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	<p>H > 2 m</p> 

	No <input type="checkbox"/>	In parte <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	<p>18. Il riempimento viene eseguito prima della fine della costruzione dei muri, in modo da permettere la posa del ponteggio a partire da un'altezza di 3 metri?</p>

<p>19. Prima di eseguire i muri del 1° piano è prevista la posa dei ponteggi di facciata (a partire da 3 metri di altezza)?</p> <p>Il personale è in grado di montare correttamente il ponteggio?</p> <p>Avete assegnato il compito del controllo giornaliero del ponteggio?</p>	No <input type="checkbox"/>	In parte <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	
	No <input type="checkbox"/>	In parte <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	
	No <input type="checkbox"/>	In parte <input type="checkbox"/>	Sì <input type="checkbox"/>	

		No <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/>	20. I lavoratori sanno che è vietato manomettere, modificare o eliminare le misure di protezione (nel caso in cui si accorgano di queste situazioni, essi sanno di risistemare la situazione e di segnalare l'accaduto ai superiori)?
--	--	---	---

21. Gli attrezzi, i macchinari e gli apparecchi difettosi vengono subito sostituiti o fatti riparare?	No <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/>		
---	---	--	--

	No <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/>	22. In merito a misure di sicurezza speciali, avete istruito il personale possibilmente per iscritto?
--	---	---

23. Il personale temporaneo dispone anch'esso dei sistemi di protezione individuali ed é stato istruito sulle regole di sicurezza esistenti nella vostra ditta?	No <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/>	
--	---	--

	No <input type="checkbox"/> In parte <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/>	24. Avete svolto almeno una riunione di coordinamento tra voi e le altre ditte presenti in cantiere? <i>"Io sono un pericolo per te e tu sei un pericolo per me! Definiamo assieme le regole di sicurezza".</i>
--	---	---

Osservazioni:

.....

.....

.....

.....

.....

Data: **Firma del responsabile:**

Nota 1: documenti accessibili nei siti www.sicuro.ch; www.ssic-ti.ch/sicurezza.html; www.suva.ch/olcostr

Nota 2: lista corsi sicurezza al Centro SSIC TI di Gordola www.ssic-ti.ch/formazione
